



25 años de proyectos Business Central: qué funciona, qué falla y por qué

Lorena Sanchis
Ramón Rautenstrauch

¡Gracias a nuestros sponsors!

PLATINO

DQS / INNOVATION
ATTITUDE

BETWEEN GROUP

sogeti
Part of Capgemini

 **TD SYNEX**

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE
TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL

 **V-Valley**

ORO

algoritmia 
powered by **Alba**

 **bravent**  **COSMOCONSULT**

 **CrossPoint**

 **devoteam**

encamina
PIENSA EN COLORES

inetum.

KPMG

 **NTT DATA**

prodware

RICOH
imagine. change.

TOKIOTA

COLABORAN

 **Cienciaterapia**

Packt

LANYARD

 **intelequia**



DQS/

SPEAKER

Lorena Sanchis

Hay una edad a partir de la cual a una folclórica se le permite dejar de cantar y ponerse a contar su vida.

Head of Business Central en DQS · más de 15 consultores · 25 años implantando ERP en empresas de todos los tamaños.

Hoy la acompaña Ramón Rautenstrauch, Microsoft MVP y evangelista de Copilot.



SPEAKER

Ramón Rautenstrauch

Apasionado ❤️ del Marketing. Microsoft MVP 😊. Evangelista Copilot 🗣️. CMO 😊. SEO 🧠. Consultor Copilot, Copilot Studio y Foundry 🏢. Facilitador PLAYMOBILpro 🗣️.



Microsoft
**Most Valuable
Professional**

LÄBERIT



V-Valley

El producto ha cambiado de nombre cinco veces. Los motivos por los que fallan los proyectos, ni una.


Roadmap de antecesores de Microsoft Dynamics 365 Business Central

1984 → 2026 → hoy

De PC&C/Navision a un ERP cloud-first de Microsoft para pymes



Business Central no fracasa. Fracasa el encaje.

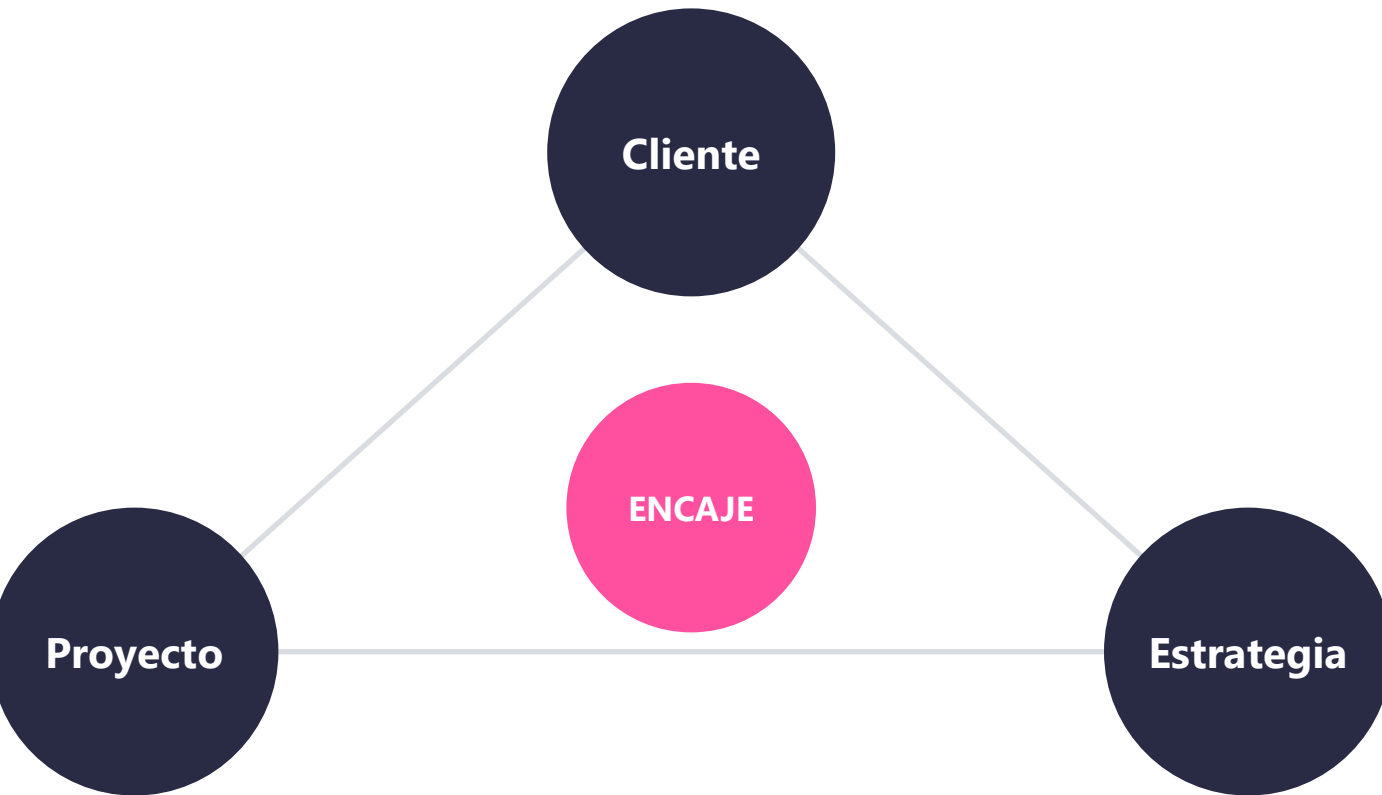

sostenido por el equipo que implanta

El éxito está en el centro.

Cada vez que uno de los tres se decide sin mirar a los otros dos, el proyecto se desplaza hacia una esquina.

La misma estrategia funciona con un cliente y fracasa con otro. El mismo cliente sale bien con un tipo de proyecto y mal con otro. Y nada de eso lo arregla la metodología escrita en la propuesta.

Qué te llevas

- 1 **Clasificar clientes** por madurez, estandarización, complejidad, dependencias, personalización y disposición al cambio.
- 2 **Distinguir los tipos de proyecto** y su impacto en alcance, gobierno y riesgo.
- 3 **Elegir una estrategia de ejecución** coherente con el cliente y el proyecto, no con lo que mejor sabe hacer el partner.
- 4 **Reconocer las señales tempranas** que aconsejan un enfoque por fases, orientado al estándar, por plantillas o de recuperación.

45

minutos

5

episodios reales

Los cinco proyectos que todos hemos visto

1

El proyecto réplica

El objetivo real, aunque nadie lo diga, es que Business Central se comporte como el sistema anterior.

2

El proyecto sin dueño

Sponsor que aparece en el kickoff y en la crisis; usuarios clave "a tiempo parcial", que es tiempo cero.

3

Vendido como rápido

A un cliente que no podía ir rápido: sin procesos definidos, sin capacidad de decisión, sin datos.

4

La plantilla sin gobierno

Roll-out internacional en el que cada filial renegocia el core y la plantilla se disuelve en la tercera.

5

Los datos al final

La migración se planifica para "las últimas semanas" y se convierte en el motivo del retraso.

Nada de esto depende del producto.

Ni de la versión. · Ni de AL frente a C/AL. · Ni de SaaS frente a on-premise. · Ni de la metodología escrita en la propuesta.

Todos dependen de haber aplicado un enfoque que no encajaba con ese cliente y ese proyecto.

Seis factores, de 1 a 5, antes de decidir nada

QUÉ ES EL CLIENTE

Madurez organizativa

Dueños de proceso, velocidad de decisión, experiencia previa con ERP.

Estandarización de procesos

Distancia entre sus procesos y el estándar de Business Central.

Complejidad del negocio

Empresas, países, monedas, fabricación, proyectos, lotes, intercompañía.

CÓMO SE VA A COMPORTAR

Dependencias heredadas

Integraciones, aplicaciones satélite, Excel críticos, NAV customizado.

Expectativas de personalización

"Que haga lo que hace el actual" frente a "queremos el estándar".

Disposición al cambio

Sponsor visible, horas liberadas de usuarios clave, historial de proyectos.

La pregunta que desvela cada factor

Factor	La pregunta de discovery	Señal de puntuación baja
Madurez organizativa	"¿Quién decide si cambia el flujo de aprobación de compras?"	La respuesta es "depende" o hay que preguntar a tres personas.
Estandarización de procesos	"Enséñame cómo hacéis hoy un pedido de venta" (verlo, no que lo cuenten).	Cada persona lo hace distinto; el proceso vive en Excel. Todos dicen "somos muy sencillos, todo estándar": el radar existe porque esa frase no es un dato.
Complejidad del negocio	"¿De cuántas formas distintas facturáis?"	Más de tres respuestas y ninguna documentada.
Dependencias heredadas	"¿Qué pasaría mañana si apagamos el sistema actual?"	Nadie lo sabe con seguridad.
Expectativas de personalización	"¿Qué es lo que no estáis dispuestos a cambiar?"	La lista es larga y empieza por pantallas e informes.
Disposición al cambio	"¿Cuántas horas semanales tiene liberadas el responsable de finanzas para este proyecto?"	Silencio, o "las que hagan falta".

"Qué es" frente a "cómo se comporta"

QUÉ ES

- Madurez organizativa
- Estandarización de procesos
- Complejidad del negocio

Se cualifica en todas las preventas.

CÓMO SE VA A COMPORTAR

- Dependencias con sistemas heredados
- Expectativas de personalización
- Disposición al cambio

Casi nunca se cualifica. Es por lo que fallan los proyectos.

Si solo pudieras medir un factor: disposición al cambio, y en concreto las horas liberadas con nombre y apellido.

Cuatro arquetipos (y una variante)

El que crece

Sale de Excel o de un programa de contabilidad. Procesos poco formalizados y por tanto maleables; pocas dependencias; muchas ganas.

Riesgo dominante: Crecer más rápido que el proyecto y no tener dueños de proceso.

El veterano de NAV

Quince o veinte años con Navision. Madurez alta en el uso del sistema, dos décadas de customizaciones, dependencias altas.

Riesgo dominante: Replicar NAV con otro logo.

El grupo

Multiempresa o multipaís. Madurez alta en central y desigual en filiales; personalización "core frente a local".

Riesgo dominante: Perder el gobierno del core.

El herido

Un proyecto fallido a medias. Confianza rota, urgencia, y una frase peligrosa: "ya sabemos lo que queremos".

Riesgo dominante: Repetir el mismo error con otro partner.

Variante — El que cambia de ERP: viene de SAP Business One, Sage, a3ERP o un vertical. Compara todo con lo que tenía, sin conocer la lógica de NAV.

El cliente que parecía un arquetipo y era otro

EPISODIO

2

2008 · RESTAURACIÓN Y
GESTIÓN HOTELERA

Cliente con 80 empresas del grupo. Muy tecnológico, muy organizado. Necesitaban implantar NAV (en ese momento era NAV) en 8 empresas de "Gestión de reservas". Fuimos con nuestro equipo preparado para hacer un proyecto super estratégico y centralizado

QUÉ PARECÍA EN PREVENTA

Parecía un cliente "maduro", conocedor de la tecnología y la funcionalidad. Tenían un equipo de IT que daba soporte y estaba al frente del proyecto de implantación. Tenían empresas que ya estaban funcionando en BC. Parecía un proyecto "fácil, rápido y para todas las familias". Es decir, parecía un cliente del tipo "Que crece"

QUÉ ERA EN EL DISCOVERY

Los usuarios de las otras empresas habían "rechazado" Navision. El equipo de IT estaba fuera del plan de implantación porque pertenecían al bloque de "servicios centrales" y este bloque de empresas no tenía previsto implantar todavía. Dirección no quería "aparatos" para obtener datos.

QUÉ HABRÍA CAMBIADO EN LA PROPUESTA

Tendríamos que haber presentado una propuesta menos ambiciosa, más centrada en la transición controlada del grupo de empresas y haber faseado el proyecto para un mejor control por parte de la dirección del cliente. Tendríamos que haberlo abordado como un cliente veterano.



Nosotros somos muy sencillos. Lo nuestro es todo estándar.

— *Todos los clientes, en la primera reunión*

Cinco tipos de proyecto: alcance, gobierno y riesgo

Tipo	Qué lo define	Alcance típico	Gobierno	Riesgo dominante
Implantación desde cero	Sin ERP previo o con herramienta básica	Finanzas + operaciones básicas; crecer después	Ligero, con decisiones rápidas	No sabe lo que no sabe; el alcance crece con el descubrimiento
Migración desde NAV	Upgrade técnico (conservar) o reimplantación (rediseñar)	Todo lo que había, más limpieza	Comité de "qué se lleva y qué se deja"	Replicar customizaciones; datos históricos; fin de soporte como plazo
Sustitución de otro ERP	Cambio de plataforma sin conocer la lógica de NAV	Similar a migración, sin punto de partida	Gestión de expectativas continua	Comparación permanente con el sistema anterior
Internacional / multientidad	Varias empresas o países sobre un mismo modelo	Core + localizaciones + roll-out	Fuerte y centralizado	Perder el control del core; requisitos legales locales
Rescate / reconducción	Proyecto parado, retrasado o con confianza rota	Primero estabilizar, después decidir	Transparencia extrema	Presión de plazo, coste hundido, decisiones por agotamiento

Las segundas fases heredan el arquetipo, pero el gobierno se relaja porque "ya nos conocemos". Ahí aparecen los sobrecostos.

Mismos módulos, distinto proyecto

Alcance funcional idéntico: Finanzas + Compras + Ventas

Implantación desde cero en "el que crece"

Datos: pocos, desde Excel; volumen pequeño

Integraciones: ninguna o una

Decisiones: rápidas, con un dueño claro

Días de cliente: pocos, pero con nombre

Riesgo: alcance que crece con el descubrimiento

Migración desde NAV en "el veterano"

Datos: años de histórico y maestros sin limpiar

Integraciones: varias, sin documentar

Decisiones: "como en NAV", reabiertas cada semana

Días de cliente: muchos: revisar cada customización

Riesgo: réplica; fin de soporte como plazo

Comparar propuestas por días de consultor no tiene sentido si no se compara antes el tipo de proyecto.

Cinco estrategias de ejecución

1

Rápida orientada al estándar

Adoptar, no adaptar. Alcance cerrado, apps antes que desarrollo, arranque en pocos meses.

Cuándo funciona: "El que crece" con disposición al cambio alta; filiales tras el piloto.

2

Transformación por fases

Por dominio (finanzas → operaciones → producción) o por unidad, con go-live real en cada fase.

Cuándo funciona: Complejidad alta, madurez media, dependencias altas.

3

Plantillas (core + local)

Empresa modelo con configuración maestra y extensiones core; localizaciones como capas.

Cuándo funciona: Grupos con gobierno central fuerte, siempre después de un piloto.

4

Centrada en la migración

Datos y código primero: inventario de customizaciones (eliminar / sustituir / reescribir) y estrategia de históricos.

Cuándo funciona: Cliente que valora la continuidad y cuyo NAV está razonablemente sano.

5

Recuperación

Parar, diagnosticar con independencia, estabilizar, redefinir y arrancar algo en corto.

Cuándo funciona: Cuando hay honestidad sobre el estado real y el sponsor asume decisiones incómodas.

Combinaciones habituales: rápida + fases · plantillas + fases (piloto y roll-out) · migración + fases.

Implantación rápida orientada al estándar

CUÁNDO FUNCIONA

- "El que crece" con disposición al cambio alta
- Filiales de un grupo, después del piloto
- Cliente que puede decidir al ritmo que exige el calendario

CUÁNDO FALLA

- Veteranos de NAV con expectativas de personalización altas
- Cliente que no puede decidir en días
- Cuando se vende como rápida a quien no puede ir rápido

CÓMO SE GOBIERNA

- Lista corta de decisiones con fecha
- Regla explícita: el estándar gana salvo justificación de negocio cuantificada
- Apps de AppSource antes que desarrollo

Adoptar, no adaptar. Y enseñar el estándar funcionando con sus datos antes de que el cliente escriba requisitos.

Proyecto centrado en la migración

CUÁNDO FUNCIONA

- Cliente que valora la continuidad
- NAV razonablemente sano y negocio que no ha cambiado mucho
- Datos y código inventariados antes de diseñar

CUÁNDO FALLA

- Cuando se usa para evitar la conversación de rediseño
- "Solo es un upgrade": la frase más cara de la profesión
- Cuando nadie sabe para qué sirve la mitad de las customizaciones

CÓMO SE GOBIERNA

- Inventario de customizaciones en tres cubos: eliminar, sustituir por estándar o app, reescribir en AL
- Estrategia explícita de datos históricos
- Migración de prueba antes del diseño

Decisión clave: upgrade técnico frente a reimplantación.

La matriz de encaje: qué estrategia le toca a cada arquetipo

Arquetipo	Rápida estándar	Por fases	Plantillas	Migración	Recuperación
El que crece	✓ ✓ encaja	✓ si hay complejidad	X	—	—
El veterano de NAV	⚠ solo si acepta rediseño	✓	X	✓ si el NAV está sano	—
El grupo	✓ en filiales, tras piloto	✓ para el core	✓ ✓ encaja	⚠	—
El herido	⚠ tras estabilizar	✓	X	⚠	✓ ✓ encaja
El que cambia de ERP	✓ si acepta el estándar	✓	X	X	—

Cada estrategia asume un comportamiento del cliente.

Velocidad de decisión · Aceptación del estándar · Capacidad de gobierno · Horas disponibles

Si ese comportamiento no está, la estrategia no funciona aunque el partner, el equipo y la metodología sean los mismos. No es que la estrategia sea mala: es que se ha aplicado a alguien que no puede ejecutarla.

La estrategia que funcionó en A y fracasó en B

EPISODIO

3

2018· Fabricante de cocinas

*Una empresa que tenía 8 empresas en el grupo. 3 de ellas operaban con NAV y 5 con Dynamics NAV (habían migrado).
Planteamos una migración de las tres empresas que faltaban, que, a diferencia de las otras 5, eran fabricantes.*

CLIENTE A

En el mismo cliente, las 5 primeras empresas, se migraron sin problema. Se hizo una migración técnica, prácticamente limpia. Los usuarios recibieron una formación básica de uso pero todo el conocimiento de estructura de datos y procesos lo tenían interiorizado.

CLIENTE B

Cuando el mismo equipo fue a preparar la migración de las otras 3 empresas, empezó a encontrar dificultades técnicas (integraciones que no podrían migrarse, funcionalidades addhoc para la fabricación que eran incompatibles con la funcionalidad de las empresas que ya tenían Dynamics NAV, usuarios reacios al cambio)

EL FACTOR DEL RADAR QUE ERA DISTINTO

El momento de cada una de las dos migraciones era distinto y, ni el cliente ni nosotros como equipo lo calibramos. Entre un proceso y otro había pasado más de un año y las empresas habían evolucionado diferente (las ya migradas, se adaptaron e hicieron avances funcionales, las que permanecieron en NAVISION, quedaron con procesos no modernizados, por lo que integrarlos en la nueva operativa requería de "reingeniería", no migración pura.

El equipo es parte del encaje, no un recurso

Estrategia	Lo que el equipo tiene que saber hacer	El perfil que la hunde
Rápida orientada al estándar	Conocer el estándar a fondo y decir "no" con argumentos; configurar antes que desarrollar; cerrar decisiones en días.	El consultor que dice sí a todo; el desarrollador que programa lo que se podía configurar.
Por fases	Gobernar alcance y documentar lo que se deja para después; una arquitectura que aguante la fase 2.	El jefe de proyecto que solo mira la fase en curso.
Plantillas / internacional	Un arquitecto de core con autoridad, un jefe de programa y alguien que hable el idioma de cada filial, literal y figurado.	El equipo central que no ha pisado una filial.
Centrada en la migración	Leer C/AL y entender por qué se hizo cada customización; responsable de datos desde el primer día.	El consultor que solo conoce Business Central SaaS y no sabe de dónde viene el cliente.
Recuperación	Un senior con credibilidad para decir verdades incómodas; perfil de diagnóstico; menos gente y más peso.	Un equipo grande de perfiles junior "para recuperar el retraso".

Se asigna por encaje con la estrategia, no por disponibilidad: "está libre" no es un criterio.

Señales de que el equipo no funciona (antes de que lo diga el cliente)

- Las mismas decisiones se reabren cada semana.
- El cliente deja de escribir al consultor y escribe al comercial, o pide "alguien más senior".
- El desarrollador desarrolla lo que el consultor debería haber configurado.
- El jefe de proyecto reporta verde tres semanas seguidas y las pruebas del cliente no han empezado.
- Las actas no existen o nadie las lee.
- Alguien del equipo ya está mentalmente en el siguiente proyecto.
- En el lado del cliente: el usuario clave no aparece, o delega en alguien sin criterio ni autoridad.

TRES ERRORES DE ASIGNACIÓN

El consultor de la demo no es el del proyecto. Si va a pasar, se dice en preventa.

El equipo espejo. La química con el cliente se ve en tres semanas y no mejora sola.

Confundir antigüedad con encaje. Un rescate necesita credibilidad; una rápida, velocidad de decisión. No siempre van juntas.

Ocho reglas para cambiar el equipo

1

La revisión de equipo se fija en el kickoff

a las cuatro o seis semanas, como un hito más. Cambiar entonces no es un fracaso: es el plan.

2

Se decide con datos

decisiones reabiertas, retrasos atribuibles y feedback del cliente recogido de forma explícita.

3

Cambiar roles antes que personas

el consultor equivocado para liderar finanzas puede ser el adecuado para datos.

4

Nunca todo el equipo a la vez

una persona, con solapamiento y traspaso documentado.

5

Al cliente se le dice antes de que lo pida

con el motivo real y lo que cambia para él desde el lunes.

6

Banquillo en los roles críticos

jefe de proyecto y consultor líder, aunque cueste tenerlo.

7

En el contrato, perfiles y no nombres

o una cláusula de sustitución por perfil equivalente.

8

El equipo del cliente también se cambia

un usuario clave sin tiempo o sin autoridad no se gestiona: se sustituye.

Al cliente no lo puedes cambiar. A quien lo atiende, sí.

El proyecto que dependió de una persona

EPISODIO

4

2020 · TECNOLÓGICO

Empresa de referencia en el sector IT, con muchos proyectos vivos y una alta complejidad de procesos. Tenían NAVISION 2,60 y querían hacer una reimplantación a Dynamics NAV 18

QUÉ NO FUNCIONABA

Estuvimos mucho tiempo analizando, documentando, recogiendo información. Análisis infinitos, revisiones de las revisiones, cambios de alcance, "pequeños matices" que te hunden un FDD, reuniones con 15 usuarios poco dispuestos al cambio.

QUÉ SE CAMBIÓ, Y CUÁNDO

[Lideré ese proyecto desde el absoluto convencimiento de mi buen hacer. Diseñé una solución impecable para cada proceso, analicé con el cliente cada área y documento una y otra vez. Y fallé

QUÉ PASÓ DESPUÉS

Tuve que cambiar de proyecto y salí. Había muy buena afinidad con los usuarios y creí que el proyecto sufriría, pero vino un consultor "palo" y.... Voilà! Recondujo el proyecto, acotó los alcances, fijó fechas de validación de documentos y procesos y, al cabo del año, arrancaron exitosamente. Tiene mi más profunda admiración y seguimos siendo amigos 😊

Señales que obligan a cambiar el modelo

Señal	Qué indica	Hacia dónde mover el modelo
"Nuestro proceso es único" más de tres veces en discovery	Baja estandarización, alta personalización	Invertir el fit-gap: mostrar el estándar antes de recoger requisitos; si persiste, fases con rediseño
Usuarios clave sin horas liberadas	Baja disposición al cambio	Descartar la rápida; reducir la fase 1 o retrasar el arranque
Lista de requisitos antes de haber visto el producto	Proyecto réplica en gestación	Sesiones fit-to-standard antes de estimar nada
Nadie conoce la calidad de los datos	Riesgo de datos oculto	Workstream de datos desde la semana 1; en NAV, migración de prueba antes del diseño
Plazo marcado por fin de soporte, licencias o requisito fiscal	Compresión de alcance inevitable	Fases: mínimo legal y operativo primero
El sponsor delega en IT	Proyecto tecnológico, no de negocio	Renegociar gobierno antes de firmar
Filiales con requisitos distintos y sin comité central	Plantilla prematura	Piloto en una entidad y gobierno antes que plantilla
Proyecto fallido y "ya sabemos lo que queremos"	Riesgo de repetir el error	Diagnóstico independiente antes de aceptar el alcance
Integraciones "sencillas" sin documentar	Dependencias ocultas	Inventario de integraciones antes de estimar
"Somos muy sencillos, todo estándar, ¿por qué es tan caro?"	Nadie ha visto sus procesos; compara su costumbre con el precio	No discutir el precio: estándar con sus datos, desglose y clasificación antes de recotizar

Escuchamos, pero no juzgamos.

Confesiones de preventa, estimación, alcance y arranque.

Lo que habría que haber hecho

Preventa

- Clasificar antes de vender la estrategia
- "Sencillo y estándar" es una hipótesis, no un dato
- Discovery, no demo
- Comparar tipo de proyecto antes que días
- Cualificar horas liberadas, no solo presupuesto

Estimación

- Por perfil de cliente y tipo de proyecto, no por catálogo
- Datos, integraciones e informes al principio
- Días de cliente, no solo de consultor
- Contingencia visible y negociada
- "Solo es un upgrade" no existe

Alcance

- Procesos con resultado esperado, no lista de funciones
- Escribir lo que NO está incluido
- Criterios de aceptación antes de arrancar
- "Ya que estamos" tiene coste, fecha y dueño

Arranque

- Kickoff = acuerdo de gobierno
- Re-validar la clasificación tras el discovery
- Equipo del cliente con nombres, horas y sustitutos
- Reglas de decisión firmadas: quién, en cuánto tiempo, y si no

Todos hemos hecho todo esto. La diferencia entre un proyecto que sale y uno que no es cuántas de estas cosas se hacen a la vez.

El error de preventa que se pagó en el arranque

EPISODIO

5

2015 · DISTRIBUCIÓN Y VENTA
DE VINOS

*Cliente que ya tiene NAV 2018
implementado. Nos pide que implantemos LS
Retail para su tienda de vinos. Son 5
usuarios.*

LA FRASE QUE SE DIJO

"Sí podemos implantar LS Retail porque tenemos experiencia en la aplicación"

EL NÚMERO QUE SE PUSO

Unos 20 ks de inversión por parte del cliente y 4 usuarios. Teníamos que implantar en tres meses, dando solución en NAV para poder realizar la implantación.

LO QUE COSTÓ MESES DESPUÉS

Tardamos más de 7 meses en poner en marcha el TPV. Nos costó muchísimas más horas de las previstas (acabamos con el margen negativo) y tuvimos que pagar, además, soporte al fabricante para que nos ayudase con algunas incidencias.

La ficha de encaje: una página, veinte minutos

- 1 Puntuar los seis factores de 1 a 5.
- 2 Identificar el arquetipo (y en qué se aleja del arquetipo puro).
- 3 Identificar el tipo de proyecto (y el subtipo, si es migración).
- 4 Elegir la estrategia con la matriz; si es una combinación, escribir el orden.
- 5 Listar las tres señales a vigilar y qué cambiaría en el modelo si aparecen.
- 6 Definir el gobierno mínimo y el equipo: sponsor con nombre, reglas de decisión, cadencia, perfiles críticos, fecha de revisión de equipo.
- 7 Re-validar en cada momento. Si el arquetipo cambia, cambia la estrategia.

**Antes de abrir la
plantilla de propuesta.**

Tarda veinte minutos y ahorra
dieciocho meses.

Se rellena en discovery, se revisa en
preventa, se firma en el alcance y se
vuelve a mirar en el kickoff.

Los cuatro momentos que deciden el proyecto

Momento	Pregunta clave	Salida
Discovery	¿Quién es realmente este cliente?	Radar puntuado y arquetipo.
Preventa	¿Qué proyecto es y qué estrategia encaja?	Propuesta coherente con el arquetipo, no con la plantilla de propuesta.
Definición de alcance	¿Qué entra, qué no, y cómo sabremos que está hecho?	Alcance por procesos, exclusiones escritas, criterios de aceptación.
Kickoff	¿Sigue siendo el mismo cliente que en preventa, y es este el equipo para él?	Clasificación re-validada, gobierno firmado, equipos con nombres, fecha de revisión de equipo, primeras decisiones con fecha.

Lo que cambia con la IA, y lo que no

LO QUE CAMBIA

- Configuración asistida por Copilot
- Desarrollo en AL con ayuda de agentes
- Documentación y análisis de datos en minutos
- Preventa: demos con los datos del cliente en horas, no en semanas
- [Ramón: dos o tres cosas concretas que ya cambian, sin demo]

LO QUE NO CAMBIA

- Los proyectos siguen fallando por el encaje, no por el producto
- Un cliente que no puede decidir no decide más rápido con IA
- Un usuario clave sin horas sigue sin horas
- Cinco nombres de producto, dos lenguajes, dos modelos de despliegue: el mismo motivo de fracaso

La IA acelera la configuración y el desarrollo. No acelera a un cliente que no puede decidir.

No elijas la estrategia que mejor sabes hacer.

Elige la que tu cliente puede ejecutar.

25

Lorena Sanchis · Head of Business Central, DQS
Ramón Rautenstrauch · Microsoft MVP

So... Any Question?

Ramón modera · Lorena y Ramón
responden

SI QUIERES ESTAR AL DÍA EN DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL:



Yun Zhu



Business Central YouTube



Stefano Demiliani



Alejandro Adelantado



SI QUIERES ESTAR AL DÍA EN IA/COPILOT:



Magda Teruel



Toni Granell



David Hurtado



Ramón Rautenstrauch



¡Gracias!



Feedback
